



**Raide-Jokeri**

Raiteilla Itäkeskuksesta Keilaniemeen

# Raide-Jokeri

Espoon erilliskohteet



**Raide-Jokeri**

Raiteilla Itäkeskuksesta Keilaniemeen

# Budjettina on hankesuunnitelman 2015 mukainen kustannusarvio

- Budjetti sisältää:
  - Suunnittelu/suunnitteluttaminen
  - Rakennuttaminen ja omistajatehtävät
  - Rakentaminen
  - Varaukset




**Raide-Jokeri**

Raiteilla Itäkeskuksesta Keilaniemeen

# Keilaniemi / Karhusaarentie

- Kehä I tunnelihankkeen yhteydessä tehdyt Raide-Jokerin päätepysäkin louhinnat
- Budjetti (hank.suunn.2015) 3 556 500 €
- Toteutuma 1 129 400 €

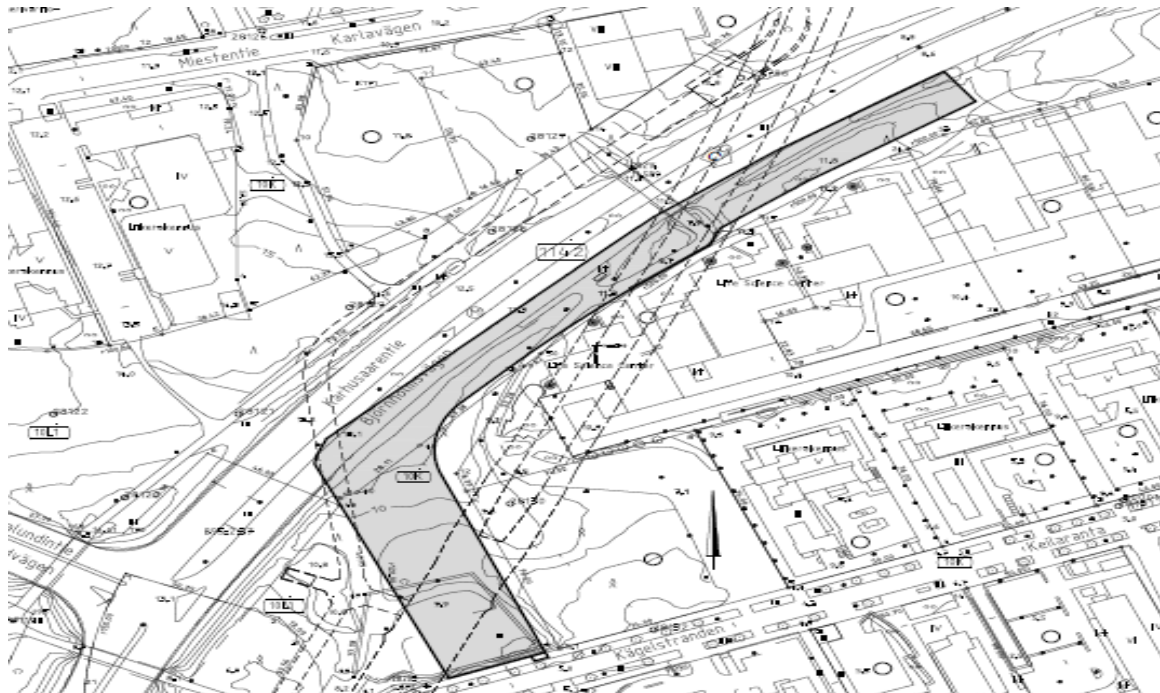




Raide-Jokeri

Raiteilla Itäkeskuksesta Keilaniemeen

# Otaniemen kampusalue

- Otaniemen korkeakoulunaukion joukkoliikennekadun Raide-Jokeria varten tehdyt pohjanvahvistukset. Arvio RJ:lle tulevista kustannuksista 908 250 €.
- Budjetti (hank.suunn.2015) 1 211 000 €
- Toteutuma 175 600 €

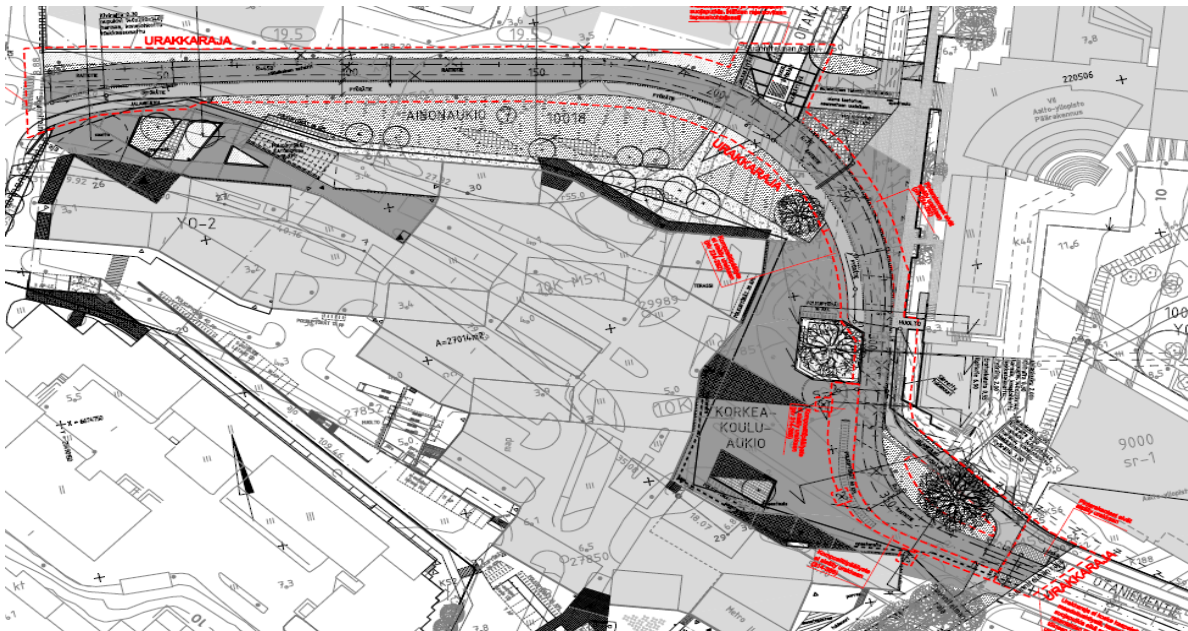




**Raide-Jokeri**

Raiteilla Itäkeskuksesta Keilaniemeen

# Perkkaantie

- Perkkaantien, Majurinkadun ja Perkkaanpolun parantaminen (GRK), 786,000 €, tukimuurien rakentaminen
- Vermontien (pohjoisosa) ja Perkkaantien (itäosa) rakentaminen (Pohjola Rakennus Group), 880, 000 €, paalulaatan rakentaminen
- Suunnittelun osuus 128 434,97 €
- Budjetti (hank.suunn. 2015) 6 330 900 €
- Toteutuma 1 794 400 €

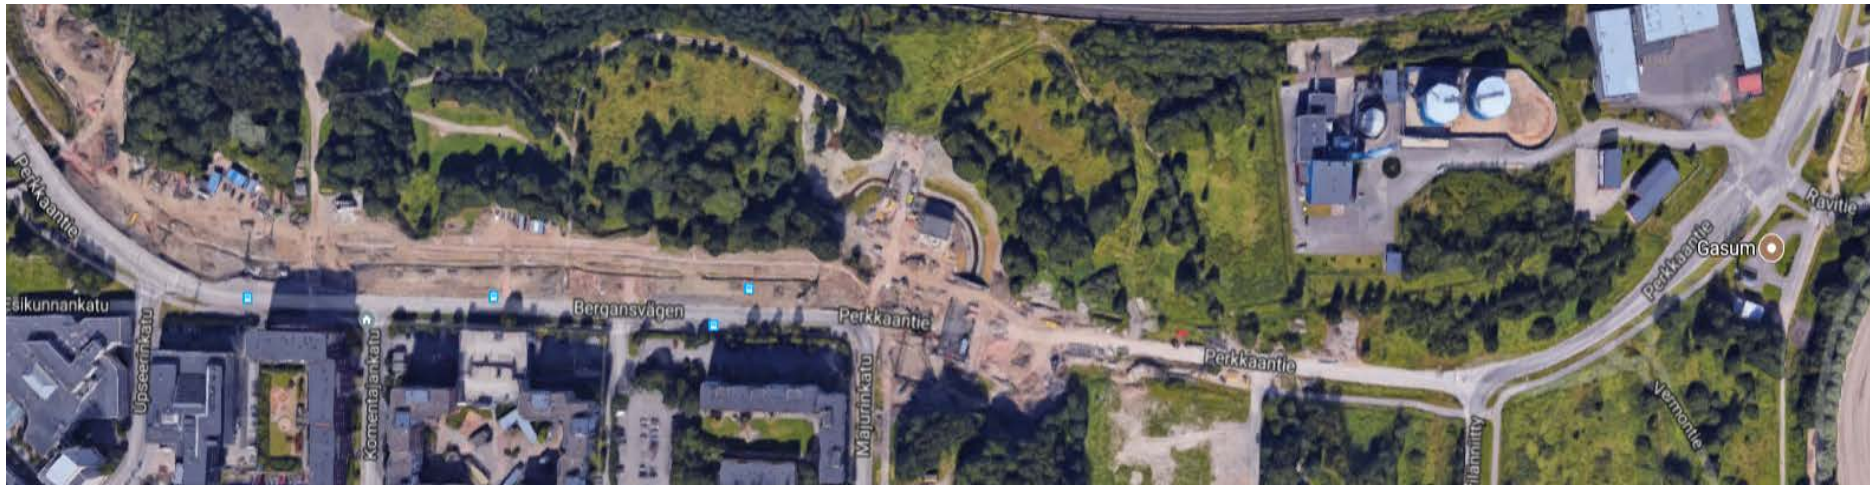



**Raide-Jokeri**

Raiteilla Itäkeskuksesta Keilaniemeen

# Yhteenvedo

Espoon erillishankkeet	Keilaniemi / Karhusaarentie	Otaniemen kampusalue	Perkaantie	Yhteensä
Erillishankkeiden ennuste	1 434 070,00 €	908 250,00 €	1 794 434,97 €	4 136 754,97 €
Erillishankkeiden toteutuma	1 129 427,91 €	175 606,66 €	1 794 434,97 €	3 099 469,54 €
Hankesuunnitelma 2015 / Raide- Jokerin budjetti	3 556 517,36 €	3 244 188,64 €	6 330 953,53 €	13 131 659,53 €
Erotus: Hankesuunnitelma 2015- Erillishankkeiden ennuste	2 122 447,36 €	2 335 938,64 €	4 536 518,56 €	8 994 904,56 €
